


工事週報 実施工程表 施工報告	令和 7 年 9 月 17 日 ~ 令和 7 年 10 月 7 日	作成： 令和7年9月24日	監督者 	現場代理人 監理技術者 	主任技術者
(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【アリーナ棟、ほか】			【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体		

区分	工事週報 (実施報告)														実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)							施工報告書	
	令和7年9月														令和7年10月															
	年/月	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7								
日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火									
施工場所	曜日																						資料の有無							

行事予定	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 巡回防犯 建築JV 全体定例 分科会 安衛協 機械JV 安全パトロール 事業主 </div>																					
アリーナ棟 (1工区) 躯体工事工程	塗膜防水 → 足場組立																					
アリーナ棟 (2工区) 躯体工事工程																						
アリーナ棟 (大アリーナ) 躯体工事工程	鉄骨建方																					
アリーナ棟 (小アリーナ) 躯体工事工程	CON打設 → 脱型 → ワイヤメッシュ敷設、止め枠 左官補修 → リング-CON → 左官補修 → スタイロ敷設																					
アリーナ棟 (1~4工区) 内部工事工程	1階工程: 天井・天井下壁ボード貼り																					
アリーナ棟 (1・2工区) 内部工事工程	2階工程: 天井下地、天井下壁LGS																					
アリーナ棟 (小アリーナ工区) 内部工事工程	3階工程: 先行 壁ボード貼り																					
	防水 → リング 段取 → リング CON																					
	ダクト吊込 (WC-3) → 機器・ダクト吊込 (倉庫、部室1~6、廊下4) → ダクト保温 (WC-3)																					
アリーナ棟 (小アリーナ工区) 内部工事工程	1階工程: 鋼製下地 (下り天井)																					
アリーナ棟 (小アリーナ工区) 内部工事工程	2階工程: 膜天井GP取付 → GW貼																					
アリーナ棟 (大アリーナ工区) 内部工事工程	シナ合板貼り																					
プール (プールピットとも)	プールピット内先行配管																					
屋外工事	北門まわり先行ガス配管 → VC取付 (東北面・各階) → 外部足場解体																					
搬入、その他	制気口BOX 2・3階分 → 全数																					

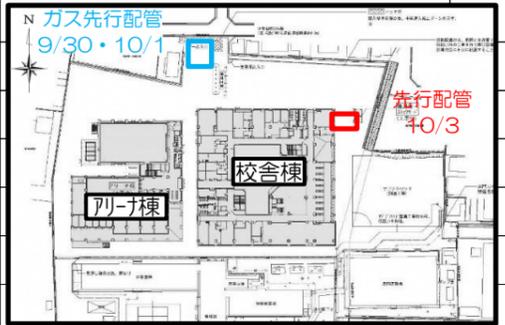

【記事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。
 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体
 監理技術者 佐田 勝

騒音・振動	[大・中・小] (左) AM (右) PM																					
打合せ、検査	◎																					
天気	◎	●	◎	○	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎
(凡例)	総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【*】																					
