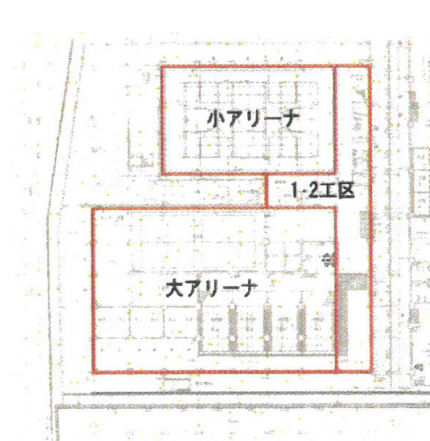
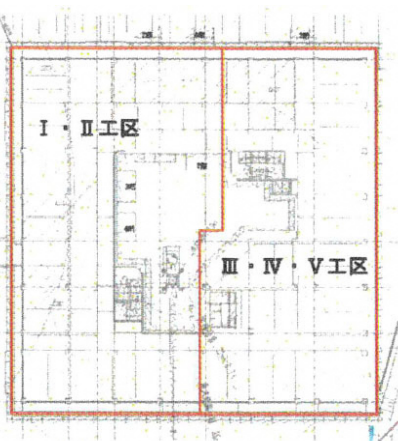


工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告			令和 7年 9月 17日 ～ 令和 7年 10月 7日																			作成: 令和 7年 9月 24日							設計監理			現場代理人		主任技術者			
			(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事																										橋本		有家		川村				
施 工 場 所		区 分	工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告													
		月／日	9.17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10.1	2	3	4	5	6	7	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。													
		曜 日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火														
校 舎 棟	R階		太陽光																																		
	4階	専有部								配線・壁仕込み							天井内仕込み																				
		共用部								配線・壁仕込み							天井内仕込み																				
	3階	専有部	股搬入(EPS)														天井内仕込み																				
		共用部	天井内仕込み														天井内仕込み							天井器具付け													
2階	専有部															天井内仕込み/天井・壁器具付け																					
1階	共用部															天井内仕込み/天井器具付け																					
ア リ ー ナ 棟	R階																																				
	3階									配線/ケーブルラック/天井・壁仕込み																											
			股搬入(EPS)																																		
	2階	I・II工区 大アリーナ								天井・壁仕込み														壁墨出し													
1階	I・II工区 小アリーナ								天井内仕込み																					壁ボード開口							
外構																								埋設配管(農具庫)													
会議・検査										◎◎																					総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】						
騒音			小	小	小	小				小	小	小	小		小	小	小	小	中	小		小	小	騒音 (一例)		小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度											
振動			無	無	無	無				無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無															
【備考】																												【記事】※検査項目等									
 【内部工区割】  【校舎棟内装工区割】																												上記の内容について確認したので報告します。									
八千代・村井特定建設工事共同企業体																																					
監理技術者 有家 正喜																																					
