

令和7年9月17日～令和7年10月7日

作成日: 令和7年9月19日

設計監理 現場代理人 監理技術者 主任技術者

工事週報
実施工程表
施工報告

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事

【受注者名】 東洋・田中健特定建設工事共同企業体

田野 佐伯 大畑 西村



区分 工事週報(先週) 実施工程表(今週) 実施工程表(来週)

施工場所 月 日 曜日 9月 10月


Main construction schedule table with columns for dates (Sep 17-30, Oct 1-7) and rows for various construction tasks like '校舎棟 屋上工事', '校舎棟 外装工事', '校舎棟 内装工事', 'アリーナ棟 屋上工事', 'アリーナ棟 内装工事', '渡り廊下', '警備員予定', 'ラフタークレーン/生コンポンプ予定', '東門通行車両', '騒音・振動', '各行事予定', '打合せ', '検査', '事前調査'.

※報告は一工程終了毎とする。(確認内容も含めて記載する。)

【お知らせ】
【8月1日～12月頃】
防水工事施工の為、
防水材料特有の匂いが発生します。

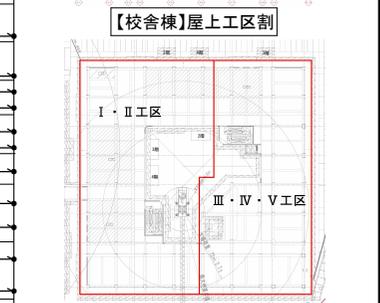

【校舎棟】内装工区割
--- : CON打設工区 (2Fスラブ)
--- : CON打設工区 (3Fスラブ)

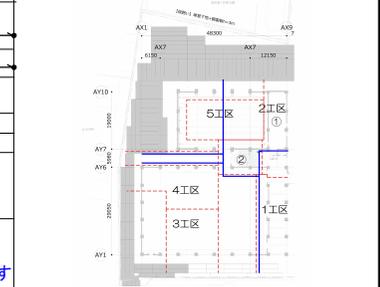

【アリーナ棟】躯体工区割

上記の内容について確認した
ので報告します。

監理技術者 氏名 大畑 勝弘

Weather forecast table with columns for weather conditions (晴, 曇, 雨, 雪) and asterisks for specific days.

【備考】
中学校
・9/26 文化祭
・10/24 体育祭
・10/27～31 教育相談
幼稚園
・10/11 運動会
・10/17 入園面談

記事 (検査項目等記載)

※BHはバックホウを示す
※TCはタワークレーンを示す
※CCはクローラークレーンを示す
※PIは生コンポンプ車を示す
※RCはラフタークレーンを示す
