

第13回宇治市交通 バリアフリー検討委員会

令和2年8月24日

宇治市都市整備部交通政策課

本日の検討事項

- (1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について
- (2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について
- (3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

基本構想策定の経過

法律の沿革

法律	高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 (交通バリアフリー法)	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー新法)
施行	平成12年	平成18年
対象	駅等の旅客施設、電車・バス等の車両、駅を中心とした周辺道路等	旅客施設、周辺道路等のほか、建築物、路外駐車場、都市公園等
	乗降客数5,000人/日以上が対象	乗降客数3,000人/日以上が対象
目標年度	平成22年度	平成32(令和2)年度

基本構想策定の経過

宇治市の計画(全体構想)

構想時期：H17.7策定、H27.3改定

目的：いわゆる「交通バリアフリー法」(H12)に基づき計画的にバリアフリー(以下「BF」と表記)を進めるため策定

- 内容：1) 市内のBF化を推進するため、**市全体の交通BF**に関する「基本理念」、「基本方針」を定める
- 2) 市内14駅を中心とした地区から「重点整備地区」を抽出


基本構想策定の経過

宇治市の計画(基本構想)

基本構想	策定期期	周辺駅	目標年次
大久保駅周辺	H18.11	JR新田 近鉄大久保	H22
宇治駅周辺	H19.3	JR宇治 京阪宇治 京阪三室戸	H22
木幡駅周辺	H28.3	JR木幡 京阪木幡	H32(R2)
黄檗駅周辺	H29.3	JR黄檗 京阪黄檗	H32(R2)
伊勢田駅周辺	H30.3	近鉄伊勢田	H32(R2)

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

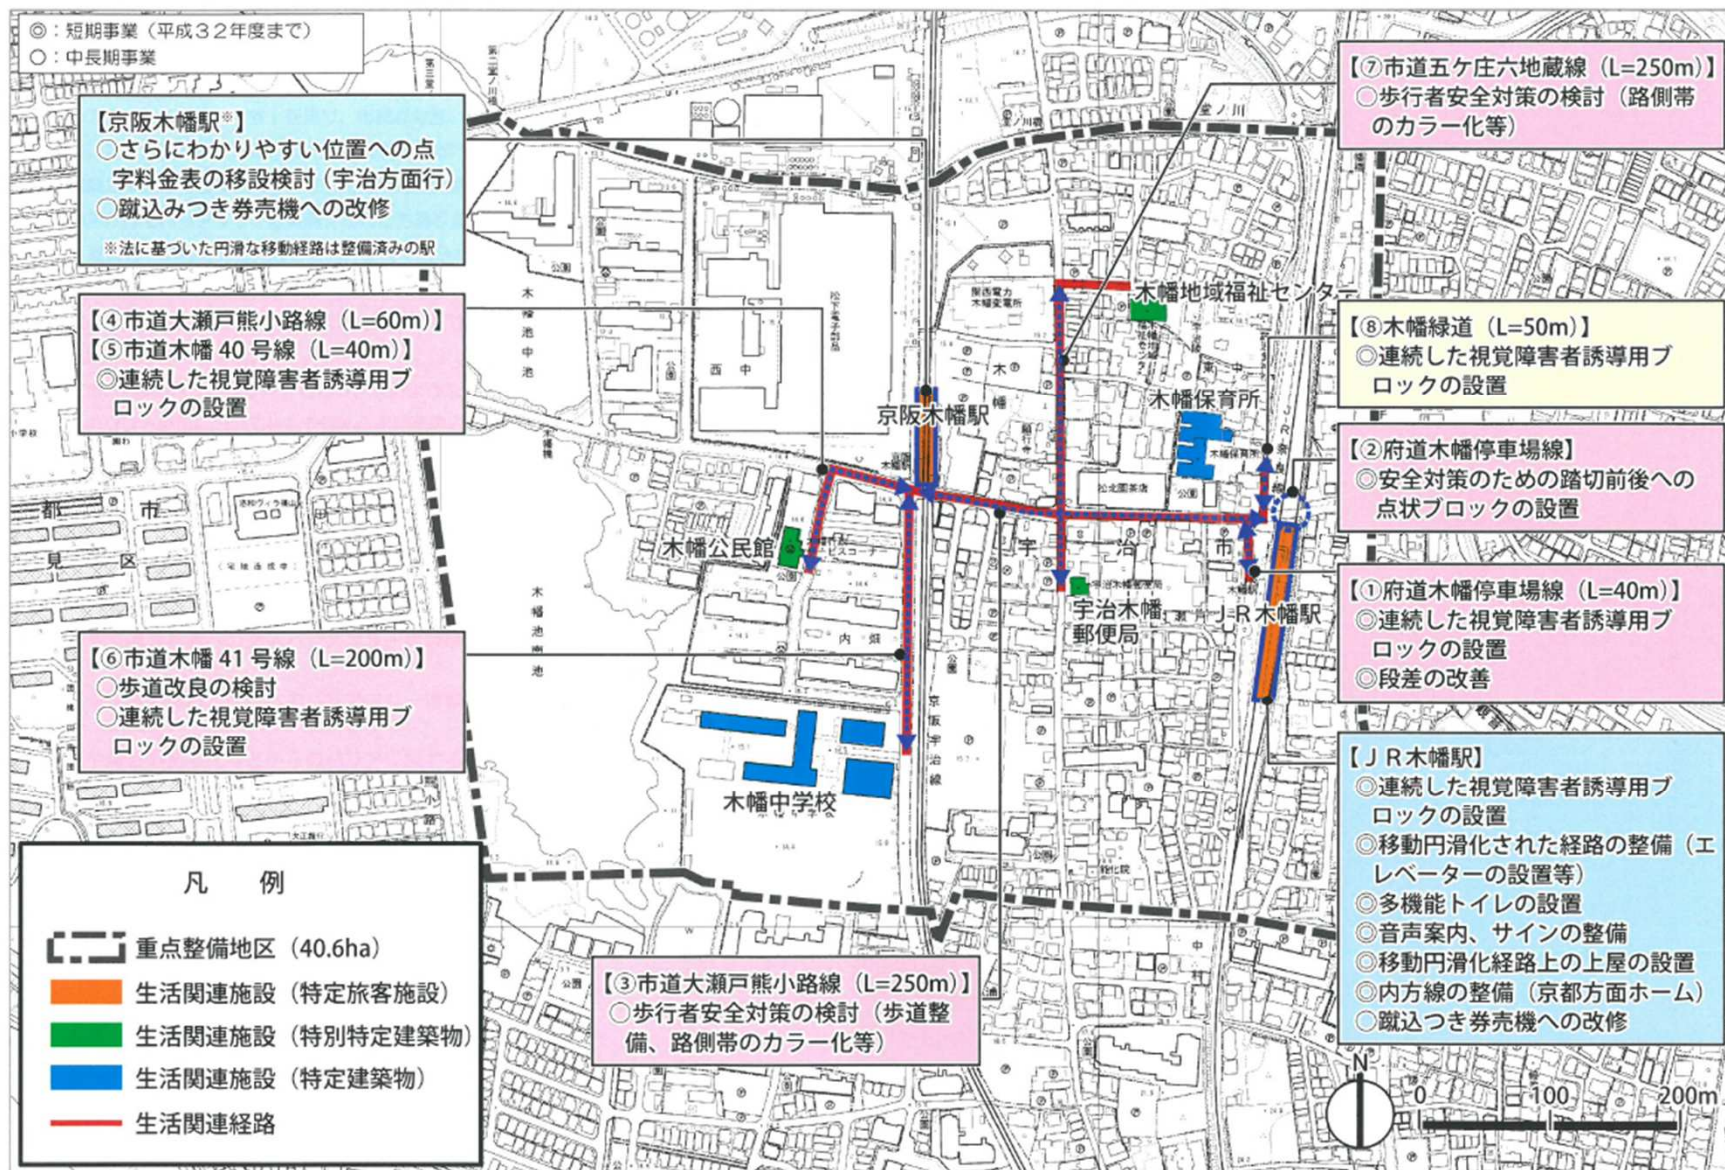

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

1) 公共交通のバリアフリー化事業

駅名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
JR木幡駅	駅入口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	JR西日本 旅客鉄道 株式会社	短期	済
	移動円滑化された経路の整備 (エレベーターの設置等)		短期	済
	多機能トイレの設置		短期	済
	音声案内・サインの整備		短期	済
	移動等円滑化経路上の上屋の設置		短期	済
	内方線の整備(京都方面ホーム)		短期	済
	蹴込みつき券売機への改修		中長期	済
京阪木幡駅	さらにわかりやすい位置への点字料金表の移設検討(宇治方面行)	京阪 電気鉄道 株式会社	中長期	未
	蹴込みつき券売機への改修	京阪 電気鉄道 株式会社	中長期	未

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

2) 道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
府道木幡停車場線 (JR木幡駅～市道大瀬戸熊小路線)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置、段差の改善	京都府	短期	済
府道木幡停車場線 (木幡踏切)	安全対策のための踏切前後への点状ブロックの設置	京都府	短期	済
市道大瀬戸熊小路線 (JR木幡駅～京阪木幡駅)	歩行者安全対策の検討 (歩道整備、路側帯のカラー化等)	宇治市	中長期	一部済
市道大瀬戸熊小路線 (京阪木幡駅～木幡公民館)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	済
市道木幡40号線 (木幡公民館前)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	済
市道木幡41号線 (京阪木幡駅～木幡中学校)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置、歩道改良の検討	宇治市	中長期	未
市道五ヶ庄六地藏線 (木幡地域福祉センター ～宇治木幡郵便局)	歩行者安全対策の検討 (路側帯のカラー化等)	宇治市	中長期	済


(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

3) 公園等のバリアフリー化事業

公園名等	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
木幡緑道 (木幡保育所付近)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	済

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について


JR木幡駅BF工事

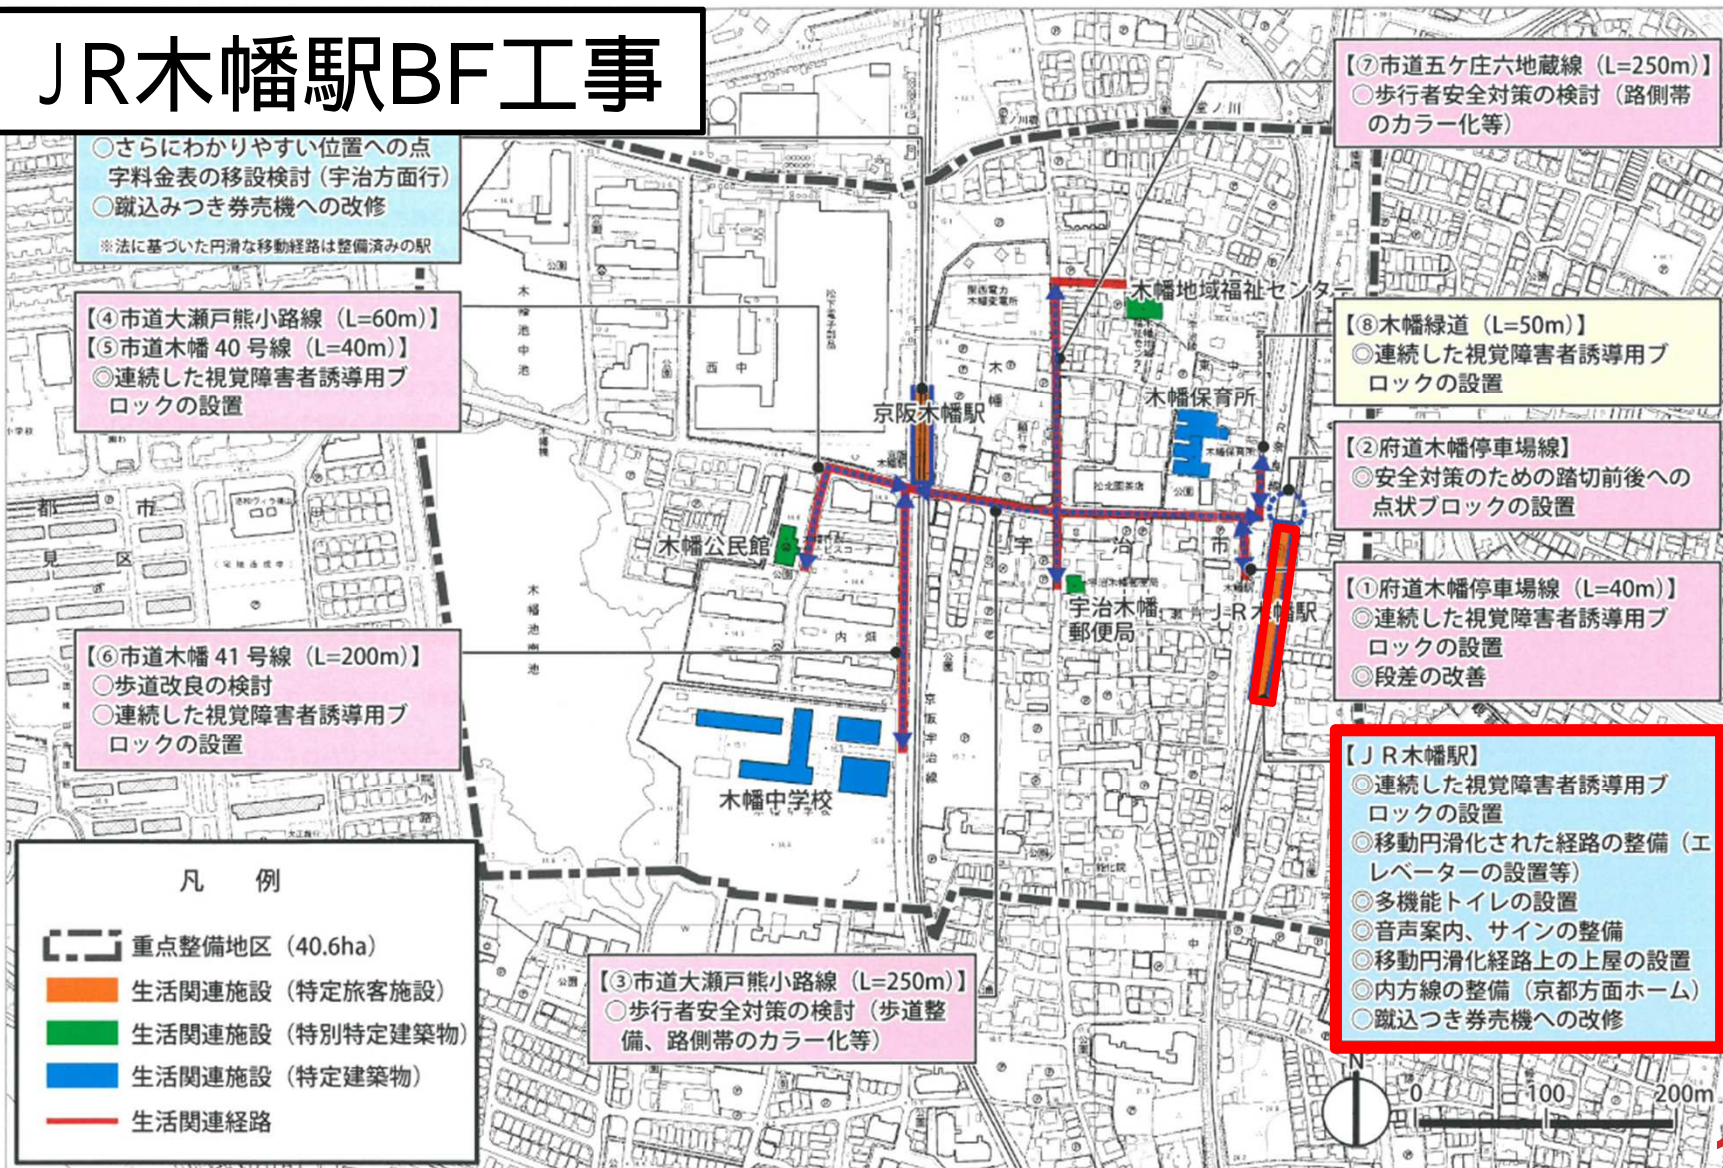

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

JR木幡駅BF工事

H30年度 工事完成

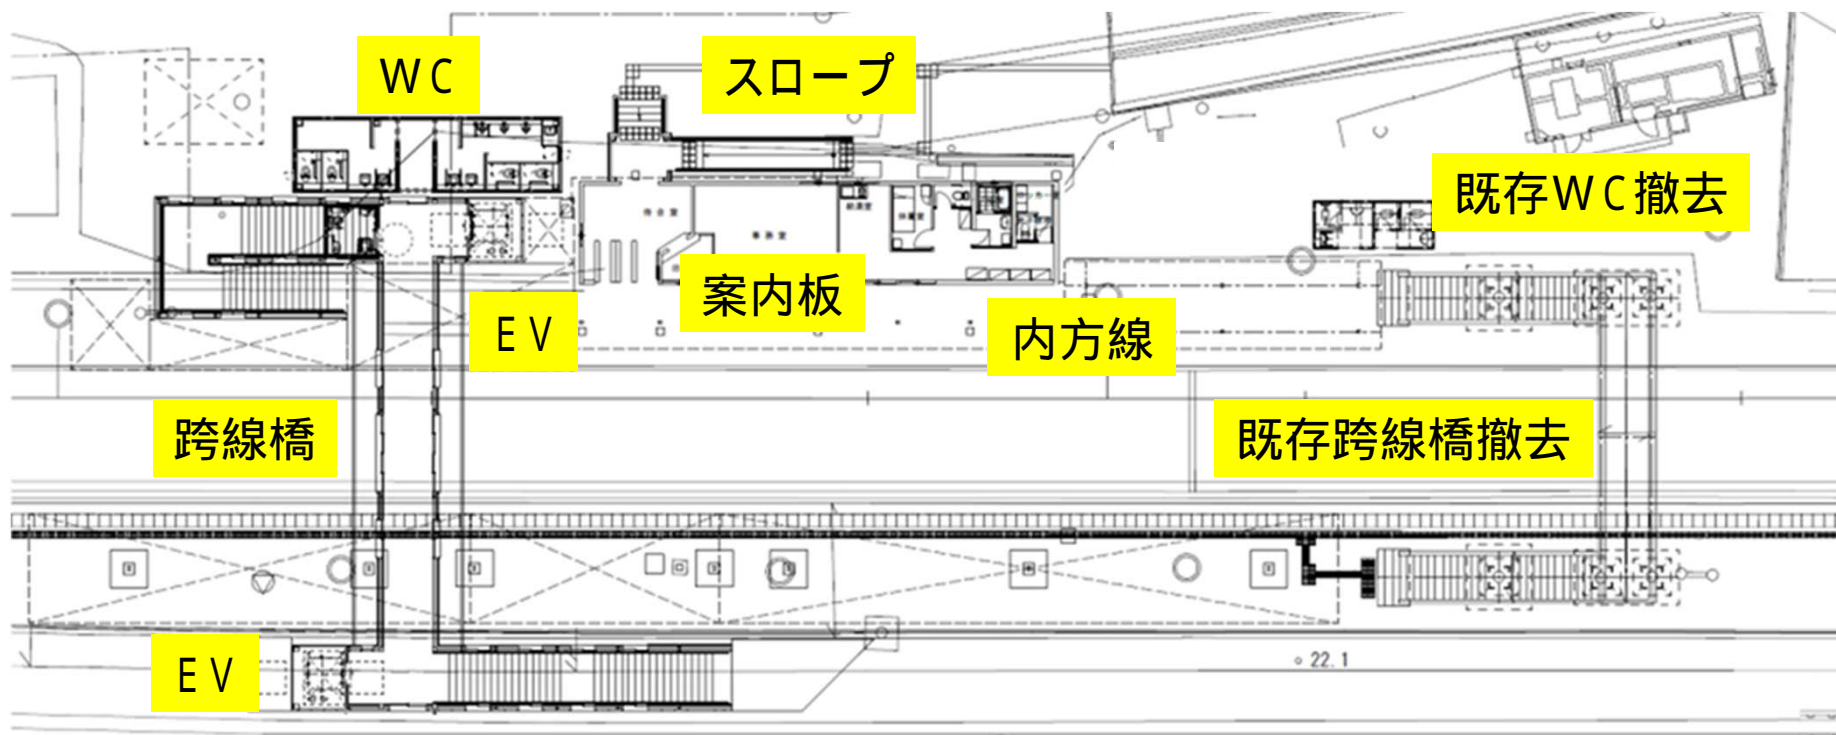

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

・スロープ、跨線橋



(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

・案内板、内方線付点字ブロック



(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

- ・エレベーター、多機能トイレ



(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

連続した視覚障がい者誘導用ブロックの設置

- 1) 府道木幡停車場線
(JR木幡駅～市道大瀬戸熊小路線)
- 2) 市道大瀬戸熊小路線
(京阪木幡駅～木幡公民館)
- 3) 市道木幡40号線
(木幡公民館前)
- 4) 木幡緑道
(木幡保育所付近)

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

1) 府道木幡停車場線




(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

1) 府道木幡停車場線



(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

2) 市道大瀬戸熊小路線(京阪木幡駅前)

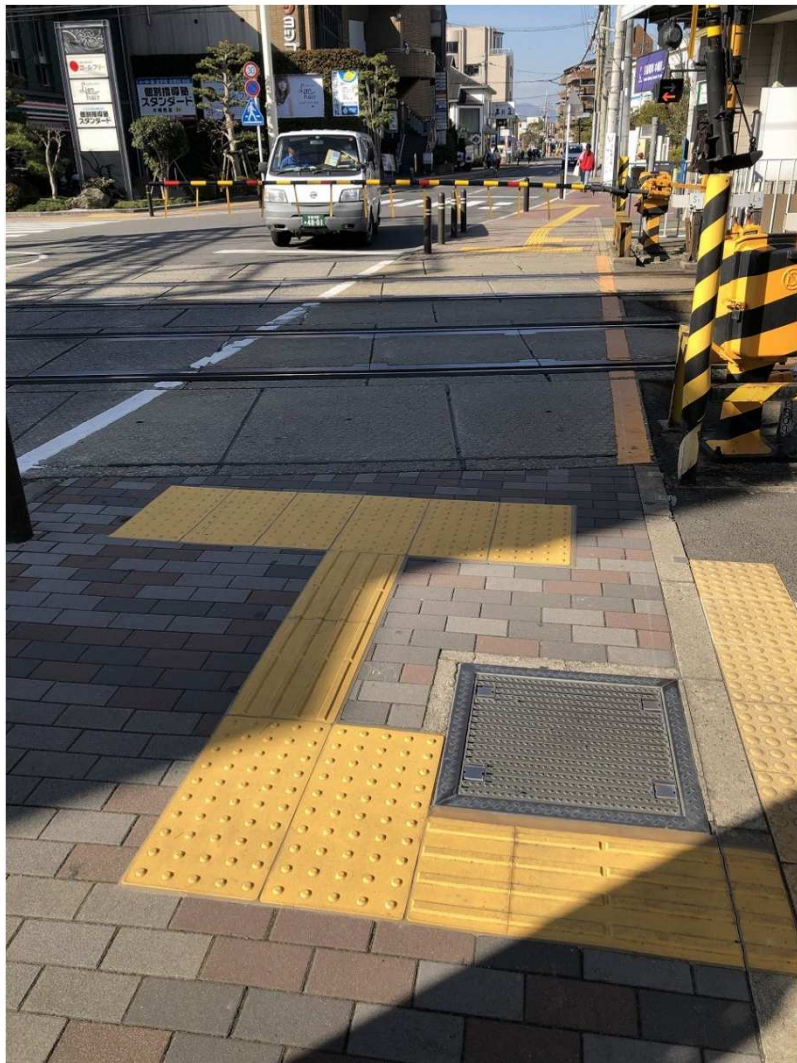

(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

2) 市道大瀬戸熊小路線(南側歩道)





(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

3) 市道木幡40号線(木幡公民館前)




(1) 木幡駅周辺地区の事業進捗について

4) 木幡緑道(木幡保育所前)

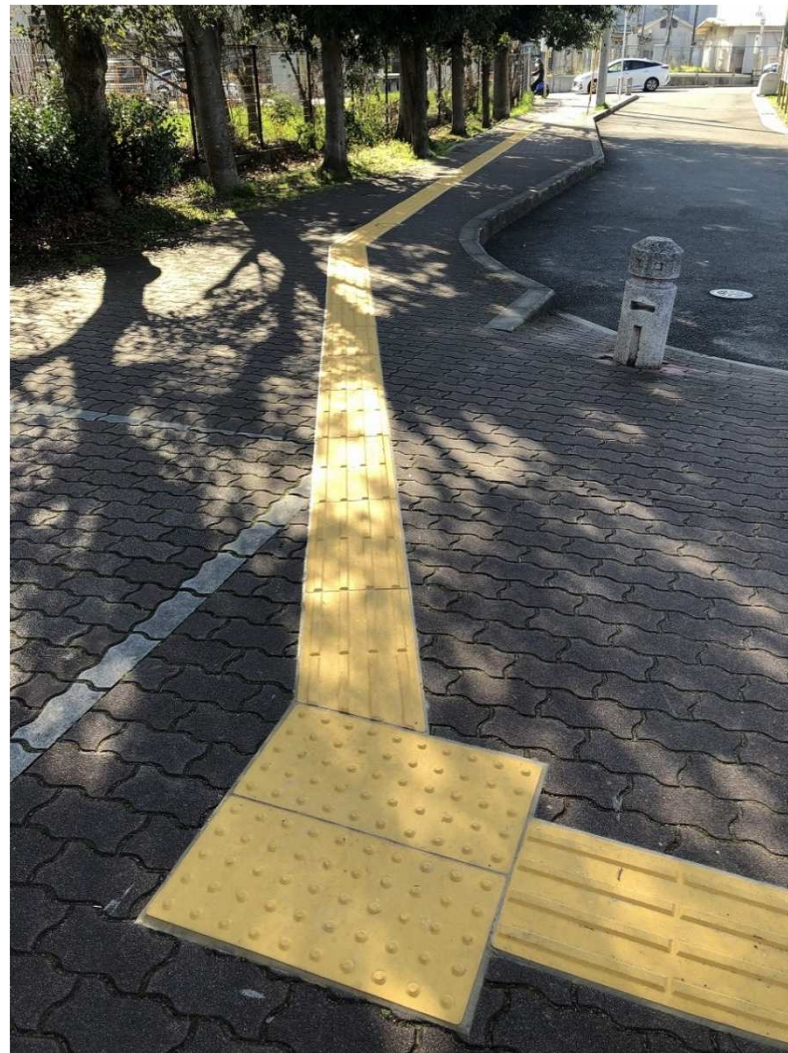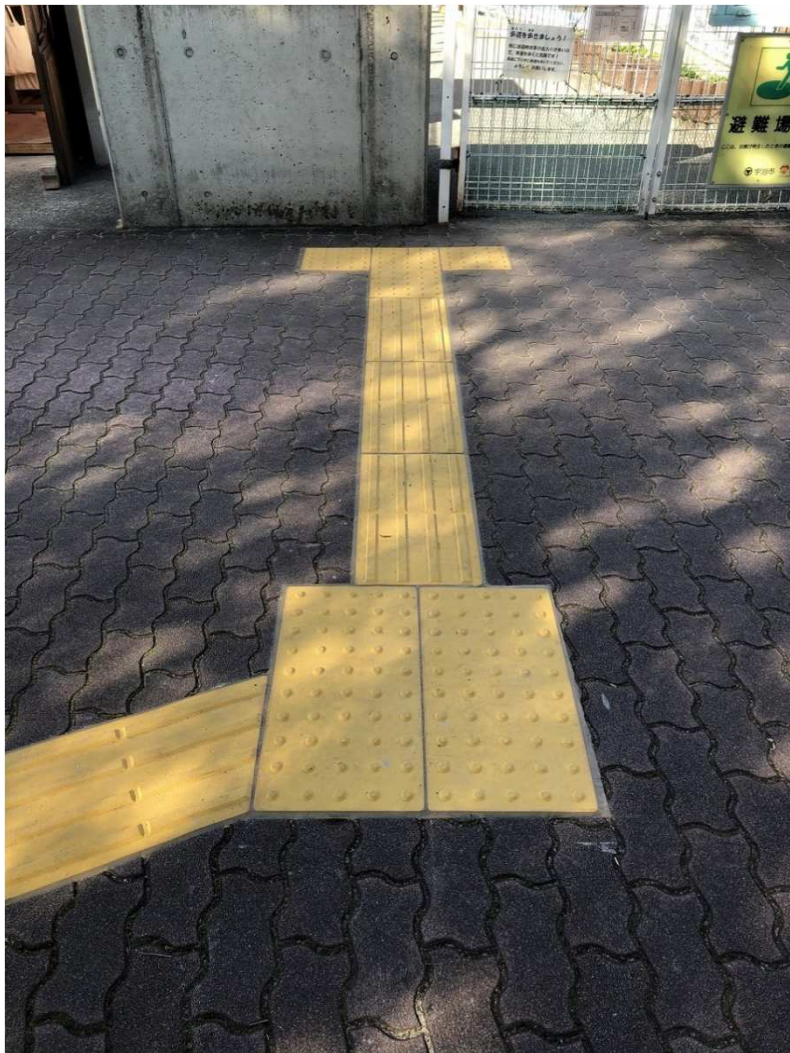

(2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

(2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

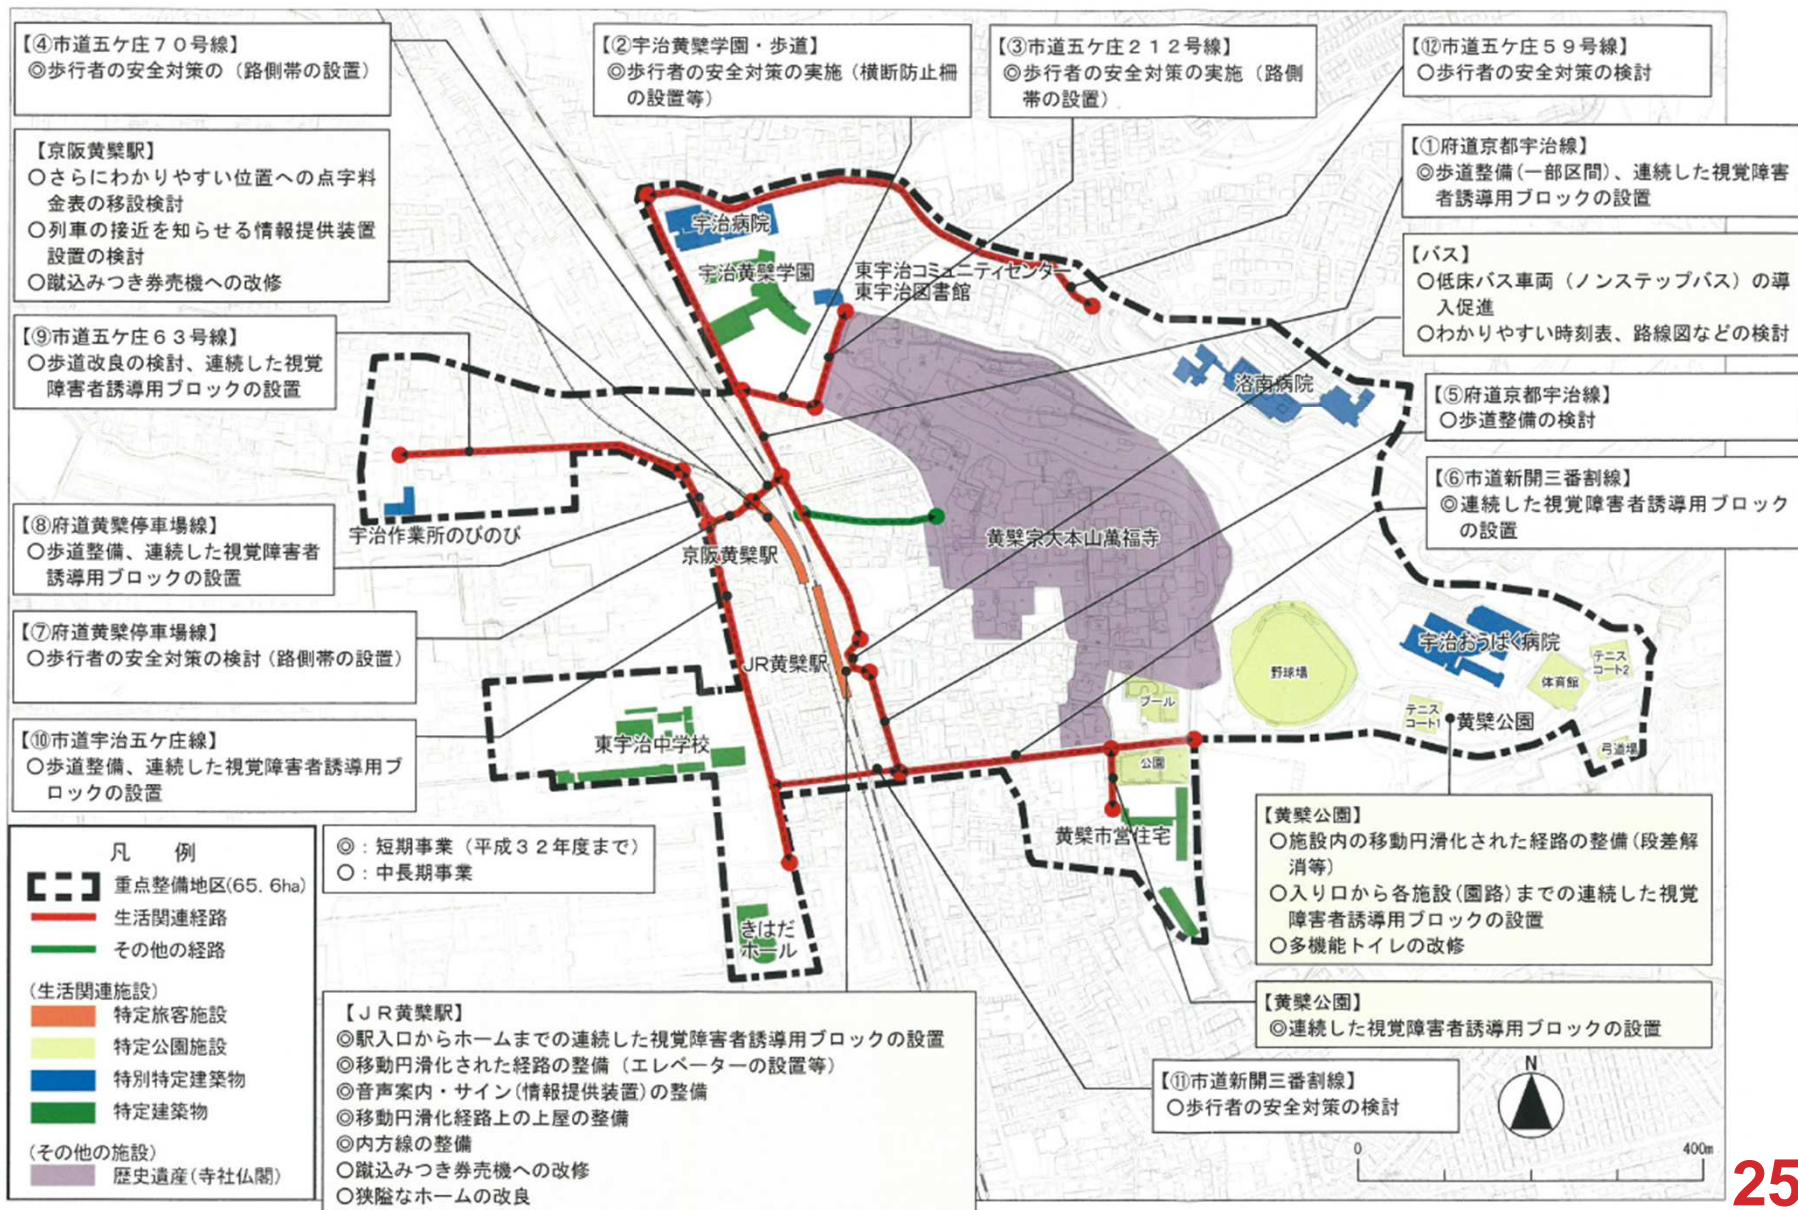

(2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

1) 公共交通のバリアフリー化事業

駅名等	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
JR黄檗駅	駅入口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	JR西日本 旅客鉄道 株式会社	短期	未
	移動円滑化された経路の整備 (エレベーターの設置等)		短期	未
	音声案内・サイン(情報提供装置)の整備		短期	未
	移動円滑化経路上の上屋の整備		短期	未
	内方線の整備		短期	未
	蹴込みつき券売機への改修		中長期	未
	狭隘なホームの改良		中長期	未

(2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

1) 公共交通のバリアフリー化事業

駅名等	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
京阪黄檗駅	さらにわかりやすい位置への点字料金表の移設検討	京阪 電気鉄道 株式会社	中長期	未
	列車の接近を知らせる情報提供装置設置の検討		中長期	済
	蹴込みつき券売機への改修		中長期	未
バス	低床バス車両(ノンステップバス)の導入促進	京都 京阪バス 株式会社	中長期	一部済
	わかりやすい時刻表、路線図などの検討		中長期	未

(2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

2) 道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
府道京都宇治線 (JR黄檗駅～宇治病院)	歩道整備(一部区間)、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府	短期	未
宇治黄檗学園・歩道 (JR黄檗駅～東宇治コミュニティセンター)	歩行者の安全対策の実施 (横断防止柵の設置等)	宇治市	短期	未
市道五ヶ庄212号線 (JR黄檗駅～東宇治コミュニティセンター)	歩行者の安全対策の実施 (路側帯の設置)	宇治市	短期	未
市道五ヶ庄70号線 (JR黄檗駅～京阪黄檗駅)	歩行者の安全対策の実施 (路側帯の設置)	宇治市	短期	未
府道京都宇治線 (JR黄檗駅～黄檗公園)	歩道整備の検討	京都府	中長期	未
市道新開三番割線 (JR黄檗駅～黄檗公園)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	R2年度 実施予定
府道黄檗停車場線 (京阪黄檗駅前)	歩行者の安全対策の検討 (路側帯の設置)	京都府	中長期	未

(2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

2) 道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
府道黄檗停車場線 (京阪黄檗駅～宇治作業所のびのび)	歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府	中長期	未
市道五ヶ庄63号線 (京阪黄檗駅～宇治作業所のびのび)	歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	中長期	未
市道宇治五ヶ庄線 (京阪黄檗駅～きはだホール)	歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	中長期	未
市道新開三番割線 (JR黄檗駅～きはだホール)	歩行者の安全対策の検討	宇治市	中長期	未
市道五ヶ庄59号線 (宇治病院～洛南病院)	歩行者の安全対策の検討	宇治市	中長期	済

(2) 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

3) 公園等のバリアフリー化事業


公園名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
黄檗公園	施設内の移動円滑化された経路の整備(段差解消等)	宇治市	中長期	未
	入り口から各施設(園路)までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		中長期	未
	多機能トイレの改修		中長期	未
	黄檗市営住宅までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		短期	未

4) 交通安全施設のバリアフリー化事業

-	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
-	信号機への音響装置の設置検討	京都府 公安 委員会	中長期	未

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

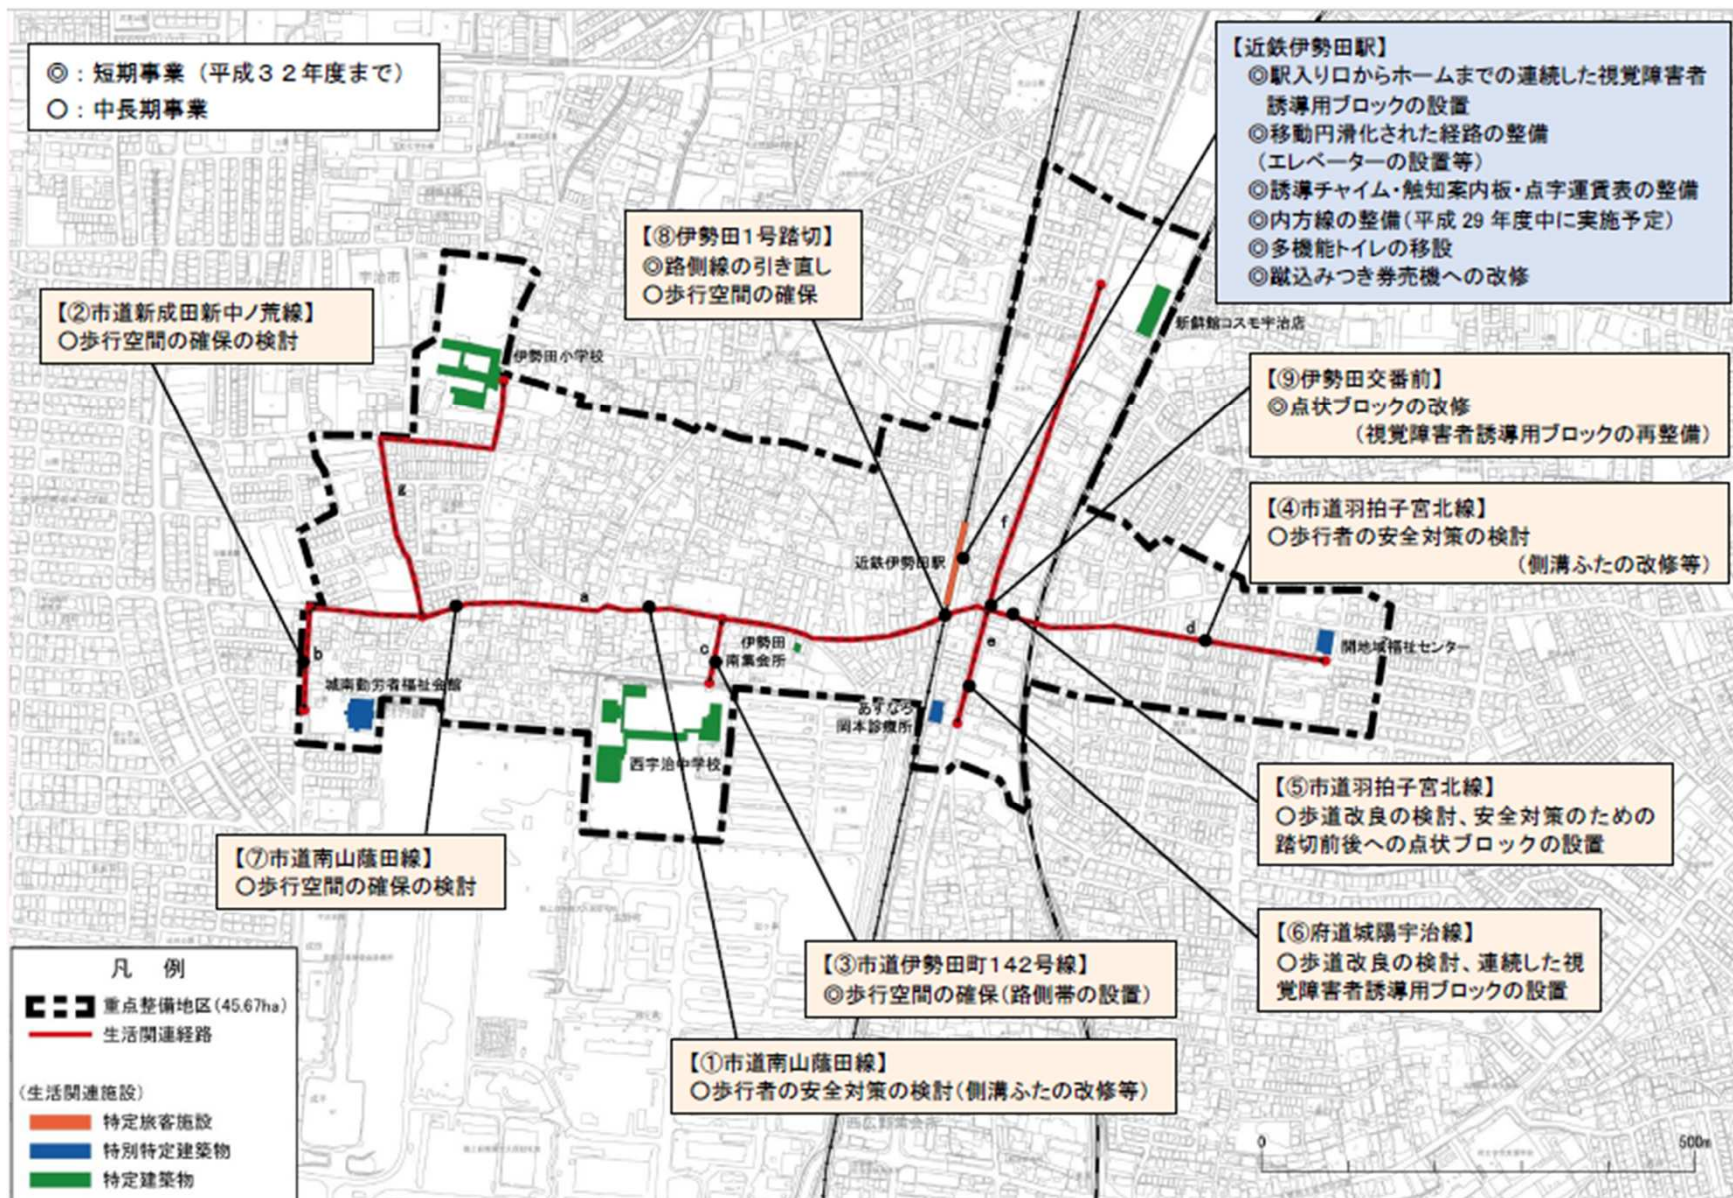

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

1) 公共交通のバリアフリー化事業

駅名等	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
近鉄伊勢田駅	駅入り口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	近畿 日本鉄道 株式会社	短期	R2年度 実施予定
	移動円滑化された経路の整備 (エレベーターの設置等)		短期	R2年度 実施予定
	誘導チャイム・触知案内板・点字運賃表の整備		短期	R2年度 実施予定
	内方線の整備		短期	済
	多機能トイレの移設		短期	R2年度 実施予定
	蹴込みつき券売機への改修		短期	R2年度 実施予定

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

2) 道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
市道南山蔭田線 (近鉄伊勢田駅～ ～城南勤労者福祉会館)	歩行者の安全対策の検討 (側溝ふたの改修等)	宇治市	中長期	一部済
市道新成田新中ノ荒線 (近鉄伊勢田駅 ～城南勤労者福祉会館)	歩行空間の確保の検討	宇治市	中長期	未
市道伊勢田町142号線 (西宇治中学校前)	歩行空間の確保 (路側帯の設置)	宇治市	短期	R2年度 実施予定
市道羽拍子宮北線 (近鉄伊勢田駅～開地域福祉センター)	歩行者の安全対策の検討 (側溝ふたの改修等)	宇治市	中長期	一部済
市道羽拍子宮北線 (近鉄伊勢田駅～伊勢田踏切)	歩道改良の検討、安全対策のための踏切前後への点字ブロックの設置	宇治市	中長期	未
府道城陽宇治線 (新鮮館コスモ宇治店 ～あすなる岡本診療所)	歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府	中長期	未


(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

2) 道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
市道南山蔭田線 (基本構想P27参照)	歩行空間の確保の検討	宇治市	中長期	未
伊勢田1号踏切 (歩行空間)	路側線の引き直し	宇治市	短期	未
	歩行空間の確保	近畿 日本鉄道 株式会社	中長期	未
伊勢田交番前 (基本構想P27参照)	点状ブロックの改修 (視覚障害者誘導用ブロックの再整備)	府警本部	短期	済

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事

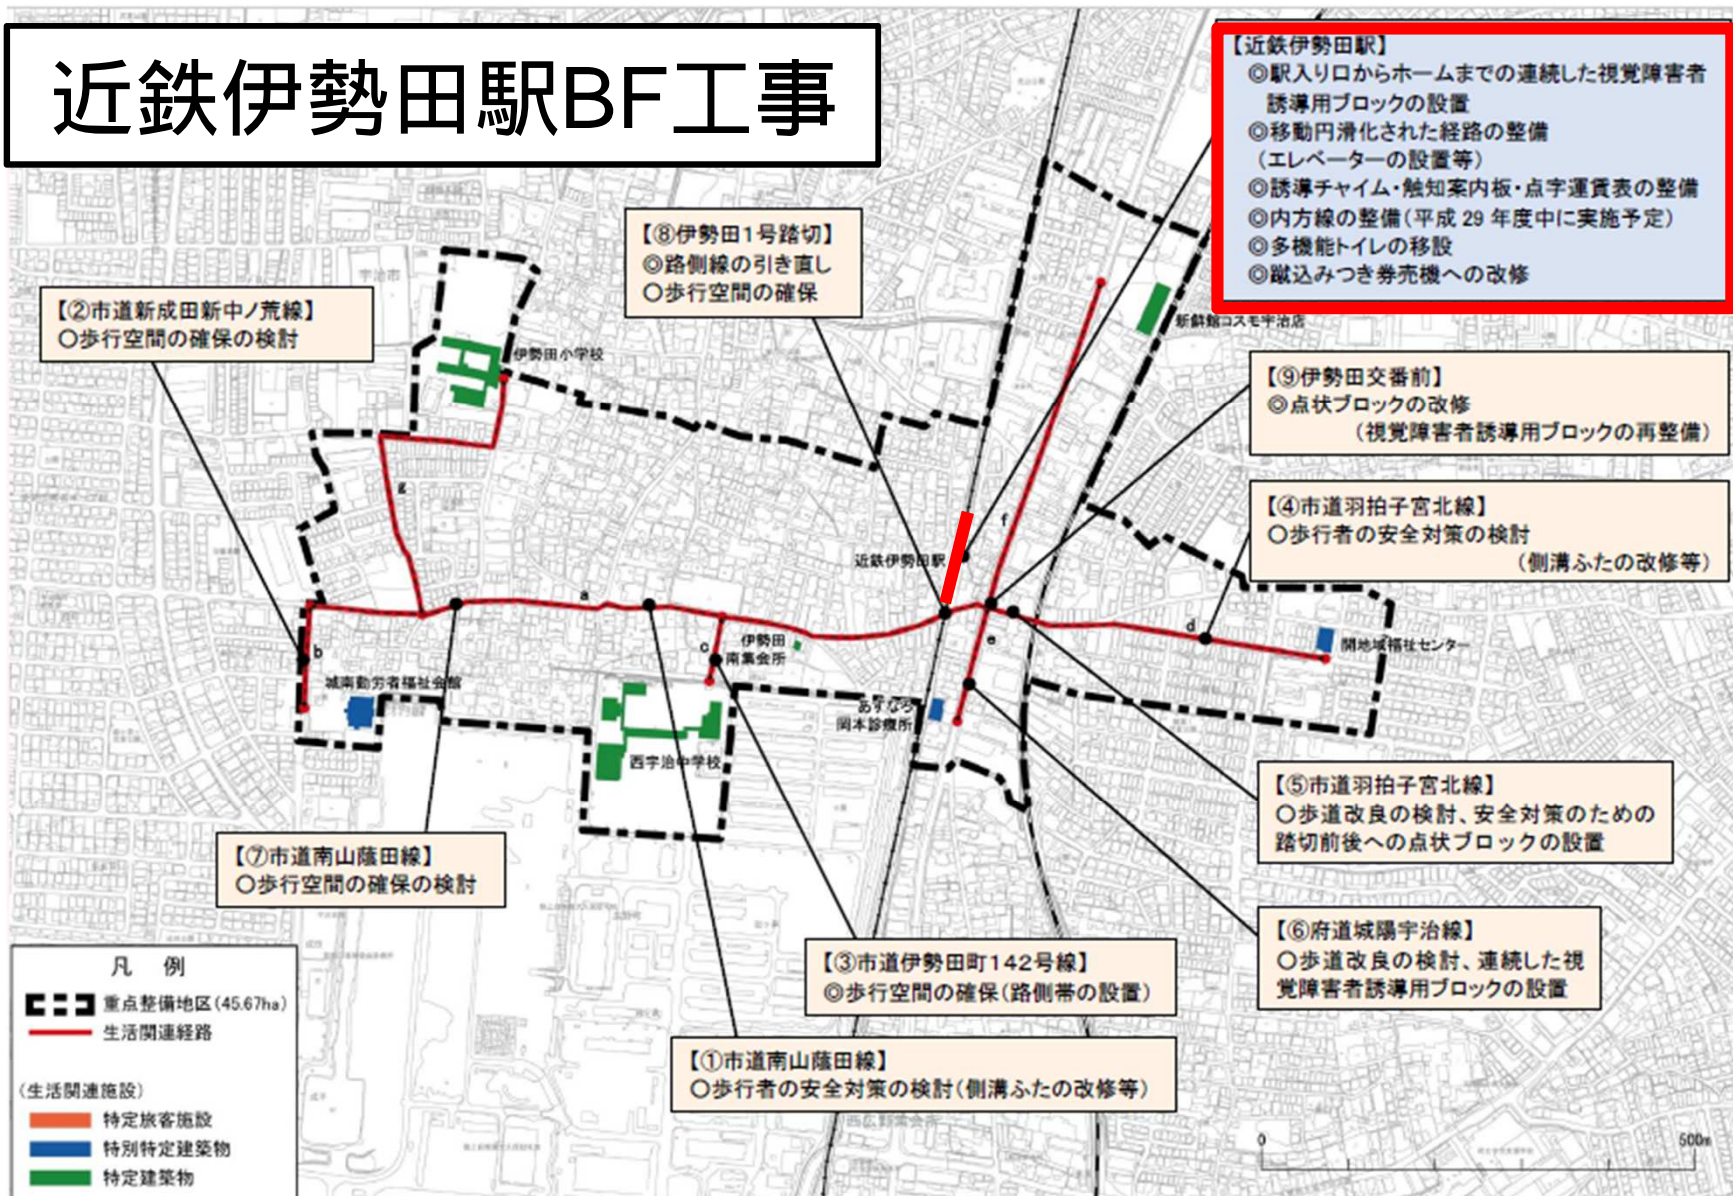


(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事

伊勢田駅 計画図 (令和2年度)

(工事概要)

- ・上り構内外併用エレベーター設置等
- ・上り構外通路構築等
- ・下り構内外併用エレベーター設置等
- ・下り構外通路構築等
- ・放送設備室、トイレ支障移設等
- ・誘導警告ブロック敷設等
- ・券売機蹴込み改良等
- ・触知案内板等
- ・点字運賃表等
- ・誘導チャイム等
- ・待合室扉改良等

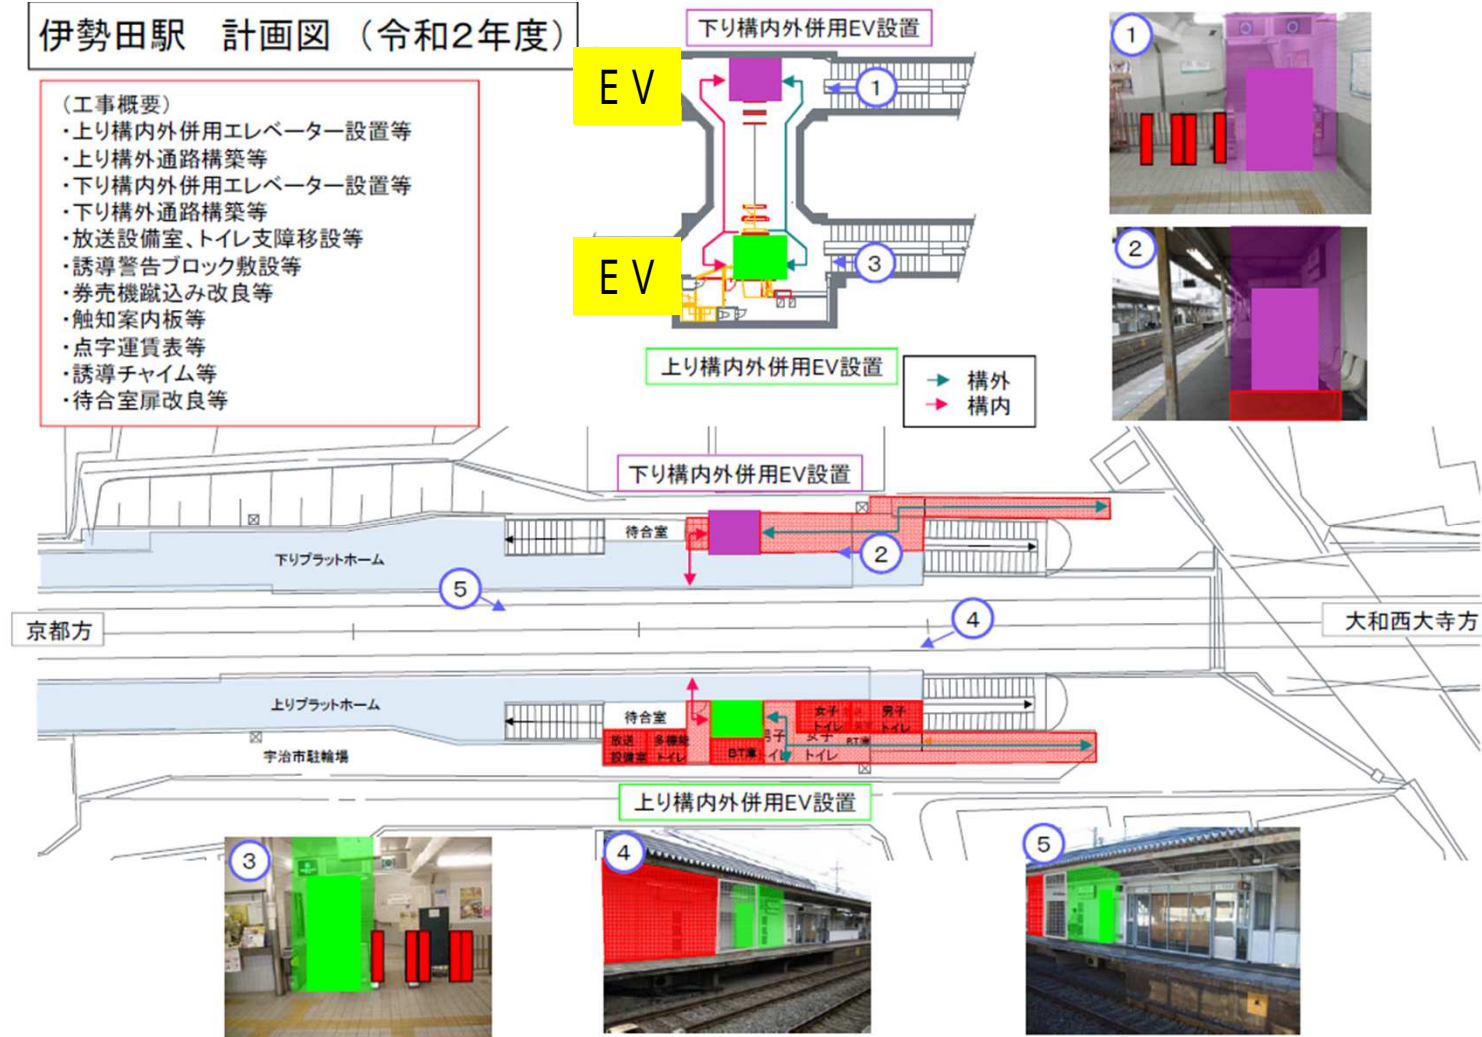

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事



仮囲い状況
(京都行方面ホーム)



仮囲い状況
(大和西大寺行方面ホーム)

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

近鉄伊勢田駅BF工事



仮設スロープ状況
(京都市行)



仮設スロープ状況
(大和西大寺行)

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について


近鉄伊勢田駅BF工事



仮設トイレ状況(京都市行)

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

伊勢田交番前点字ブロックの改修

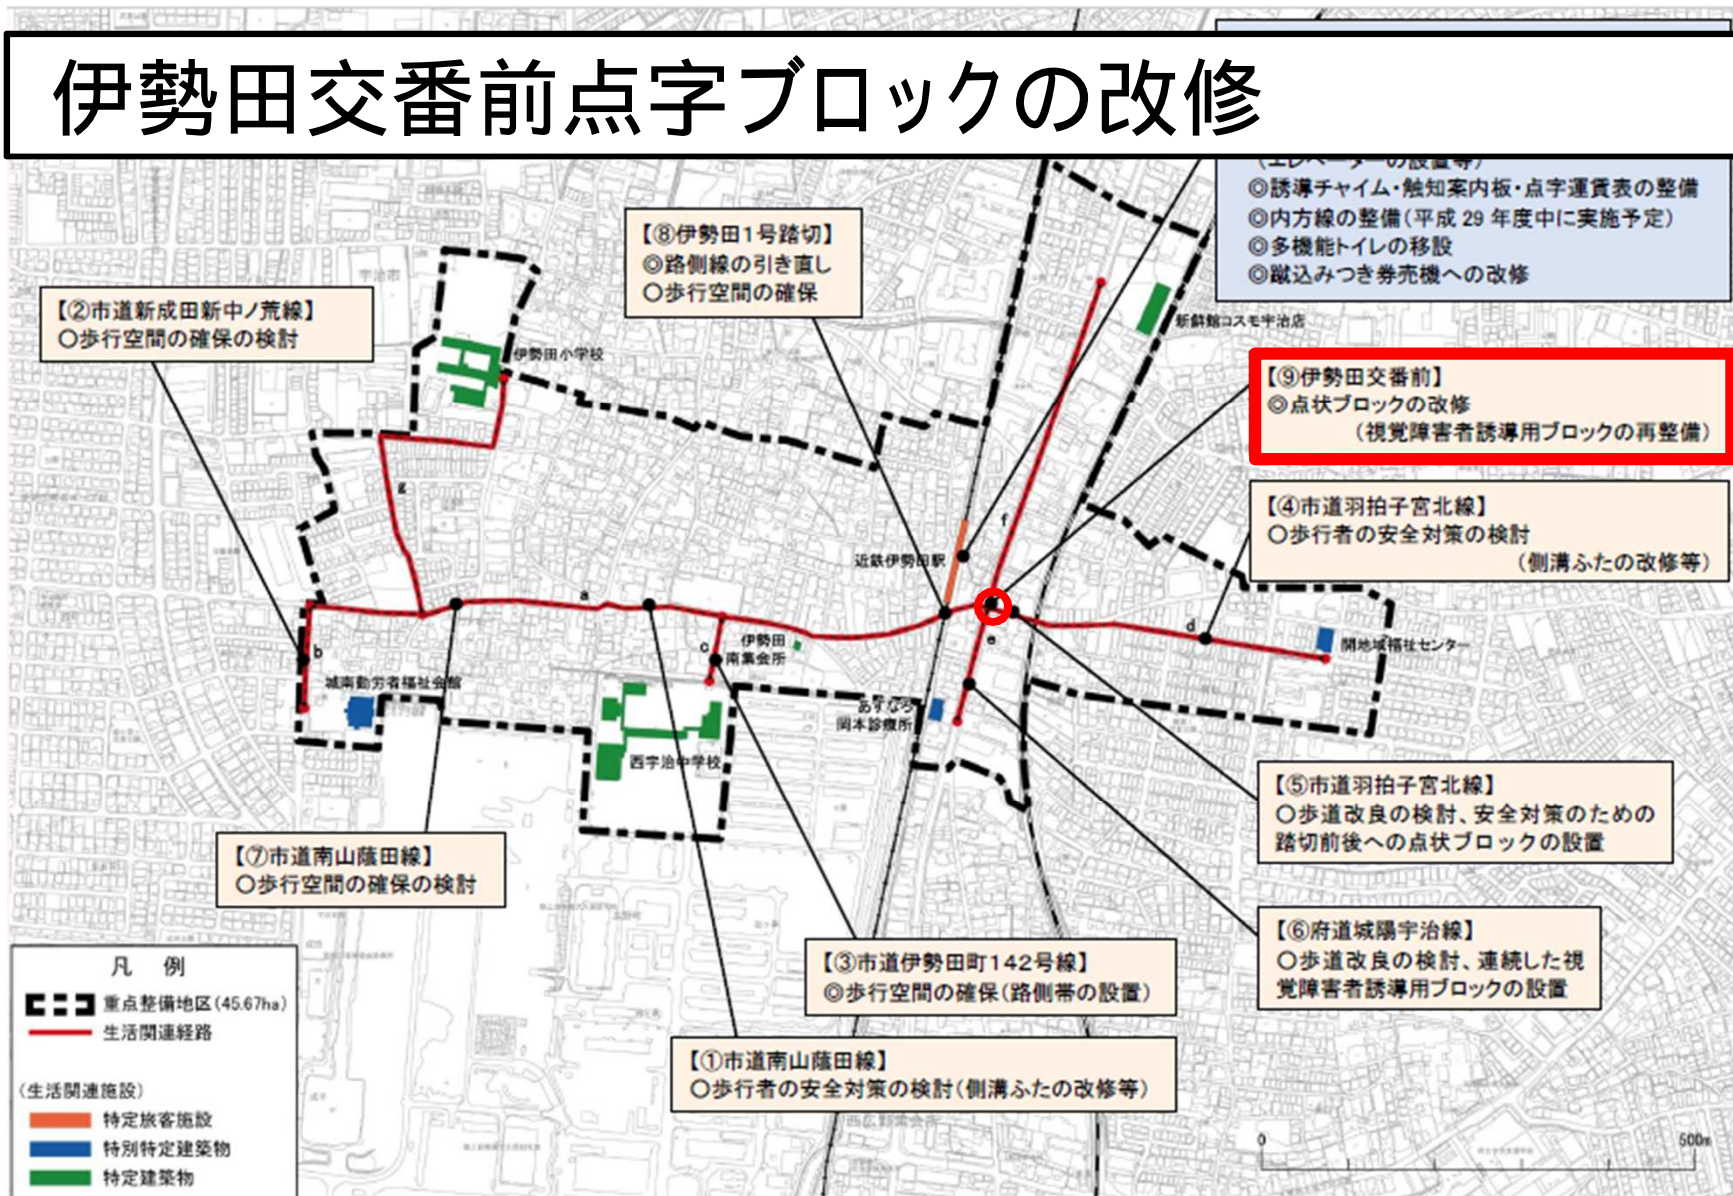

(3) 伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

伊勢田交番前点字ブロックの改修




今後について

未実施の事業について

各基本構想には

「目標年次は原則H32年度とするものの、関係機関等との協議状況に応じて柔軟に対応するものとする」と記載




終了していない事業については、引き続き事業実施に向け調整を行う。

その他の事項

その他の事項

- R2.5.20 バリアフリー新法の一部を改正する法律
(改正法)を公布
- R2.6.19 改正法の一部を施行(残りはR3.4.1~)
併せて基本方針の全部改正も施行
- R2.7.3 改正法に基づく基本方針における次期目
標の中間とりまとめを公表



国の動向を注視し対応について検討予定
