様式－15　　…機械設備工程　　…建築工事工程

No. 85

工事週報 実施工程表 施工報告

令和 7 年 9 月 17 日 ～ 令和 7 年 10 月 7 日　　作成： 令和7年9月24日

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【校舎棟】

【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理者	現場代理人 監理技術者	主任技術者

区分	工事週報（実施報告）							実施工程表（今週）							実施工程表（来週）						
年／月	令和7年9月														令和7年10月						
日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
施工場所 曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

施工報告書

※報告は一工程終了毎とする。（確認内容も含めて記載する）

資料の有無

行事予定

災防協 建築JV　全体定例 分科会　安衛協 機械JV　安全パトロール 事業主

校舎棟（A・B工区）西・南 躯体工事工程

アスファルト防水　目地割　ワイヤーメッシュ敷設、止め枠　ｼﾝﾀﾞｰCON

校舎棟（C・D工区）東・北 躯体工事工程

軒天塗装　足場解体　アスファルト防水　目地割　ワイヤーメッシュ敷設

校舎棟（1・2工区）内部工事工程

1階工程：壁塗装

2階工程：天井下地・ボード貼り、壁塗装　天井器具パネル・制気口 取付

3階工程：天井下地・ボード貼り、壁塗装

4階工程：先行区画壁 LGS／ボード　天井下地・ボード貼り　WC防水　LGS仕込配管・配線　各所ＰＳ内配管立上げ（屋根裏へ）　同左配管保温　ダクト吊込（WC2）　同左ﾀﾞｸﾄ保温　ダクト保温（理科室など）

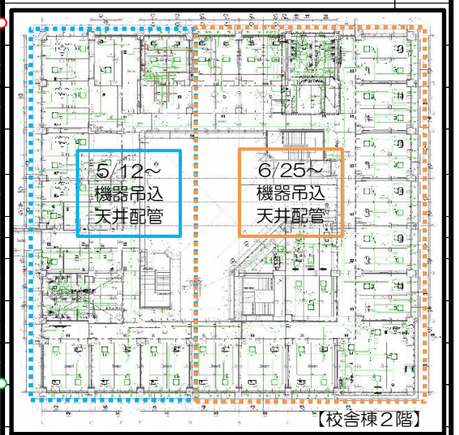

【校舎棟２階】

校舎棟（3～5工区）内部工事工程

1階工程：壁塗装　塗膜防水　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷設　ｼﾝﾀﾞｰCON　墨出し　天井下地　シンダー内コロガシ配管　CON立会い

2階工程：天井下地・ボード貼り、壁塗装　天井器具パネル・制気口 取付

3階工程：天井下地・ボード貼り、壁塗装　防水　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ段取　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞCON

4階工程：先行区画壁 LGS／ボード　天井下地・ボード貼り　WC防水　LGS仕込配管・配線　冷媒・ドレン配管（普通教室９(1)～(4)）　気密試験(仮)　冷媒・ドレン配管（特別支援学級：中(1a～3b)、生徒会室）　気密試験(仮)　ダクト吊込（普通教室８(1)～(4)）　ダクト吊込（普通教室９(1)～(4)）　ダクト吊込（特別支援学級：中(1a～3b)、生徒会室）　ダクト吊込（WC2）　同左ﾀﾞｸﾄ保温　ダクト保温（普通教室８(1)～(4)）　ダクト保温（普通教室９(1)～(4)）　ダクト保温（特別支援学級：中(1a～3b)、生徒会室）　各所ＰＳ内配管立上げ（屋根裏へ）　同左配管保温

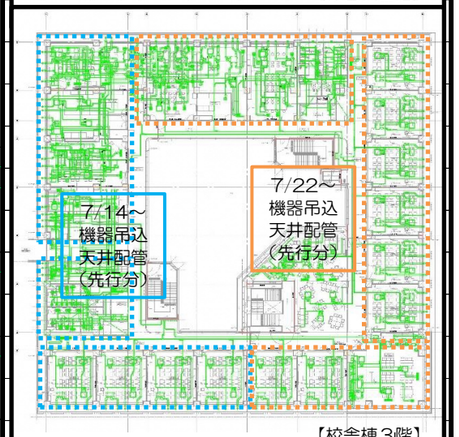

【校舎棟３階】

その他作業

VC取付（東西南北面・各階）

【記　事】※検査項目等記載

搬入、その他

器具ﾊﾟﾈﾙ 2階分　制気口BOX 4階分　制気口 2階分　ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 全数

騒音・振動【大・中・小】（左）AM（右）PM

打合せ、検査：◎

天気：◎ ● ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ●

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者　佐田　勝

（凡例）　総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】　　晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】
